Nr.		Vorgangsı	Vorgangsname
1			**Lückenschluss Satteldorf - Bestandstrassen**
2			Tiefbau + Dokumentation
3			Übergabe Dokumentation an AG
4			**Bauabschnitt 1 (Marktlustenau)**
5			Tiefbau + Technische Ausrüstung + Dokumentation
6			Übergabe Dokumentation an AG
7			**Bauabschnitt 2 (Bergbronn)**
8			Tiefbau + Technische Ausrüstung + Dokumentation
9			Übergabe Dokumentation an AG
10			**Bauabschnitt 3 (Waldtann)**
11			Tiefbau + Technische Ausrüstung + Dokumentation
12			Übergabe Dokumentation an AG
13			**Bauabschnitt 4 (Bergertshofen)**
14			Tiefbau + Technische Ausrüstung + Dokumentation
15			Übergabe Dokumentation an AG
16			**Bauabschnitt 5 (Mariäkappel/Nord))**
17			Tiefbau + Technische Ausrüstung + Dokumentation
18			Übergabe Dokumentation an AG

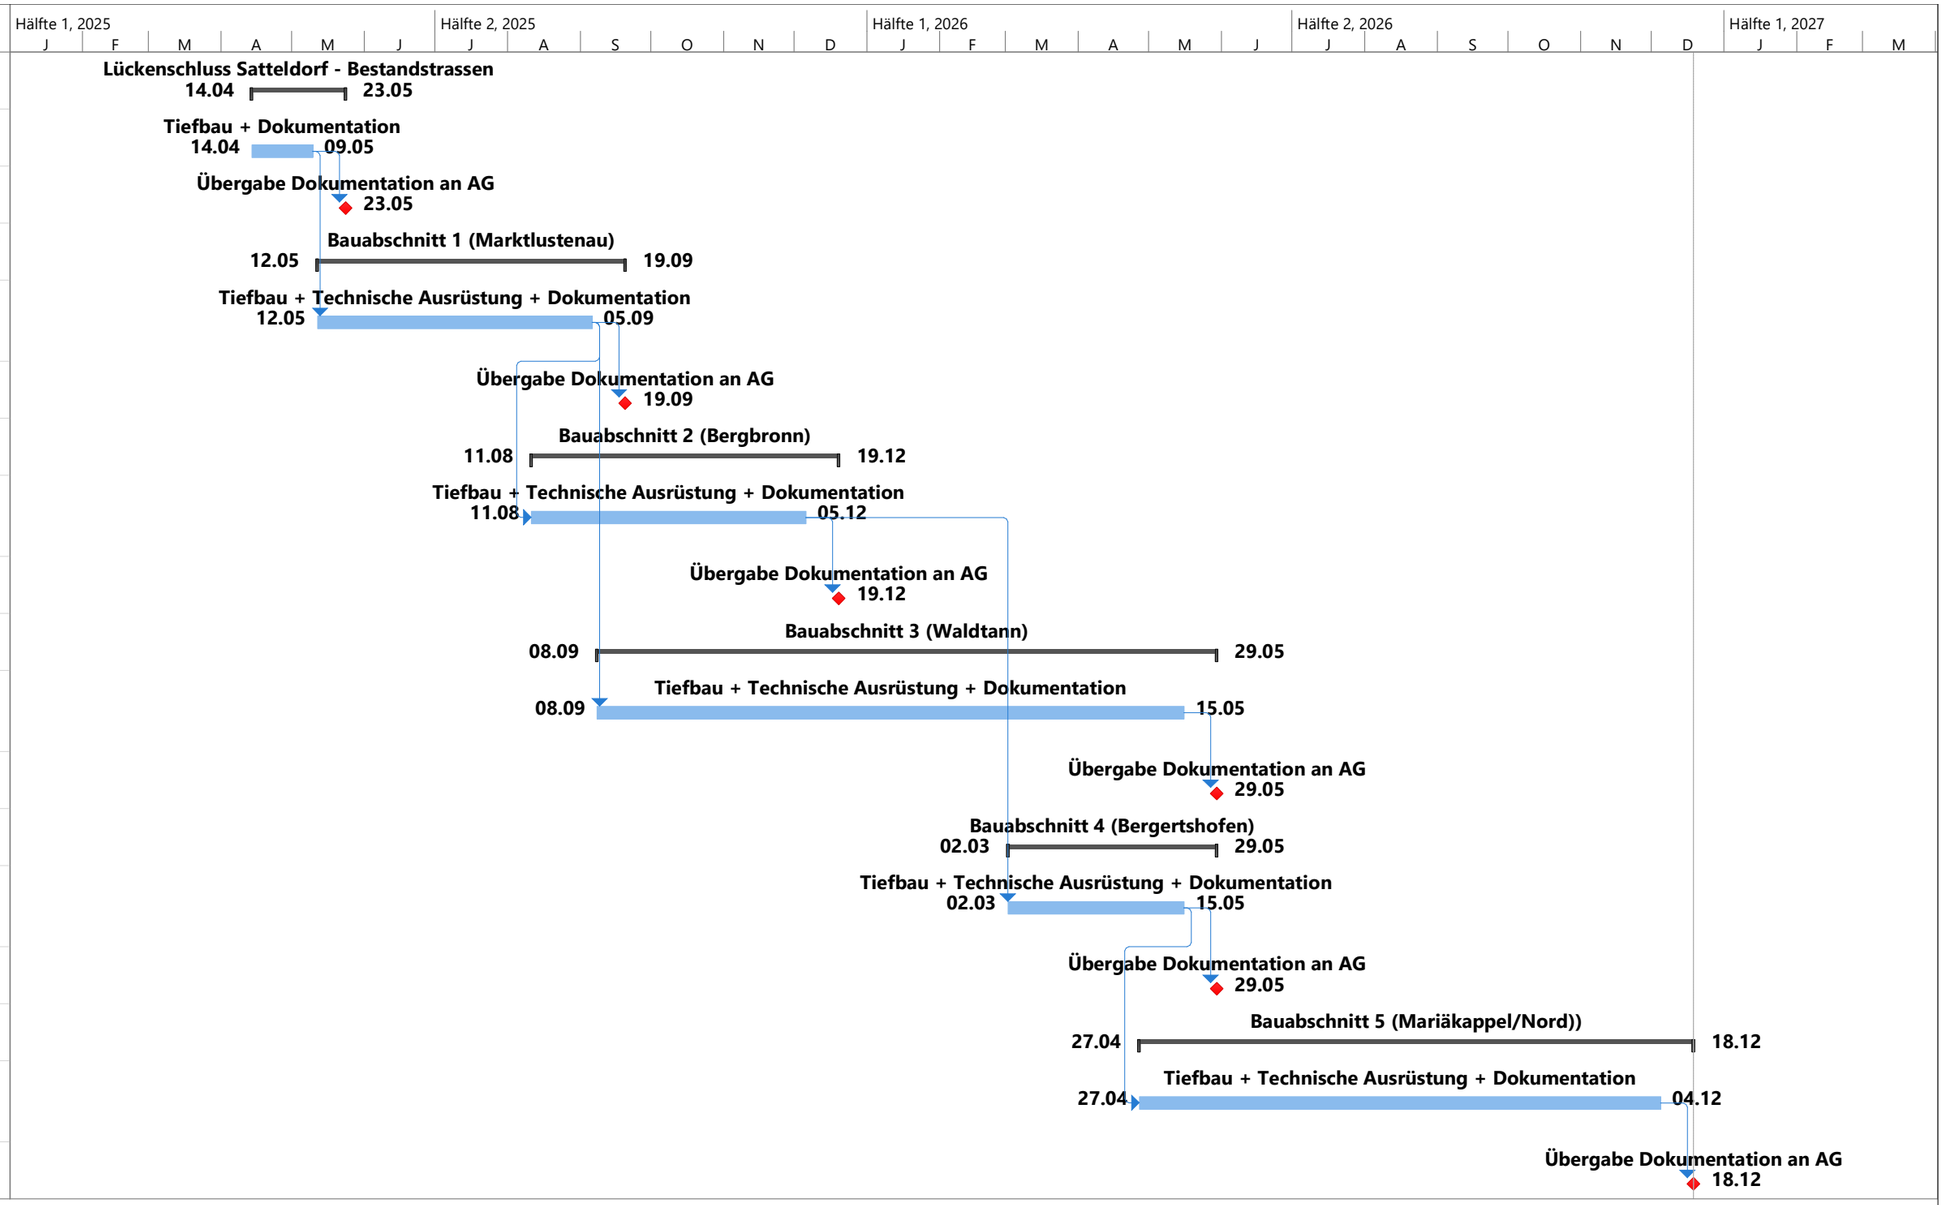

Projekt: Terminplan V1
Datum: Die 10.12.24

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
